



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: إدارة المخاطر في المشاريع رقم المقرر: PRM-125

المبادئ والمفاهيم

تهدف الوحدة إلى:

1. ترسيخ المفاهيم الأساسية: تعريف الطالب بمفهوم خطر المشروع، والتمييز بين الأثر السلبي (التهديدات) والأثر الإيجابي (الفرص)
2. التفريق بين مستويات المخاطر و توضيح الفرق الجوهرى بين المخاطر الفردية (على مستوى الأنشطة وحزم العمل WBS) والمخاطر الإجمالية للمشروع (على المستوى الاستراتيجي)
3. فهم السلوكيات والمواقف و التعرف على التوجهات الذهنية المختلفة لأصحاب المصلحة تجاه المخاطر وكيفية التعامل معها.
4. تأكيد المبادئ التنفيذية و تبيان إدارة المخاطر كعملية تكرارية مستمرة، وتوضيح أهمية التواصل والمسؤولية المشتركة في نجاحها.
5. تحديد المسؤوليات القيادية إبراز الدور المحوري وال 11 مسؤولية رئيسية لمدير المشروع في قيادة وتطبيق إدارة المخاطر.





بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

1. المعرفة والفهم لخطر المشروع كحدث غير مؤكد واستيعاب العلاقة بين "احتمالية الحدوث" و"مستوى الأثر"
2. المهارات التحليلية والذهنية في تحليل السلوكيات و تصنيف أصحاب المصلحة حسب توجهاتهم (متقبل للمخاطرة، رافض، محايد، أو متسامح).
3. ربط الأهداف و تقييم تأثير المخاطر على أهداف المشروع الأساسية (النطاق، الوقت، التكلفة، والجودة).





تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

١. تعريف وأنواع الخطر.
٢. توجهات المصلحة.
٣. العملية التكرارية.
٤. التواصل والمسؤوليات.
٥. دور مدير المشروع



3.1 مقدمة إلى إدارة مخاطر المشروع



التوافق مع المعايير العالمية

تتوافق هذه المبادئ عموماً مع النهج المتبع في المعايير العالمية لإدارة المخاطر (مثل معايير PMI) حتى وإن اختلفت المصطلحات في بعض التفاصيل. ملاحظة: يتم تناول التنفيذ التفصيلي لعمليات إدارة المخاطر في الفصول اللاحقة من هذا المعيار.



المفاهيم الأساسية

يقدم هذا الفصل المفاهيم والركائز الأساسية اللازمة لفهم وتطبيق إدارة مخاطر المشروع بفاعلية على مختلف أنواع المشاريع. تساعد هذه المفاهيم في بناء بيئة عمل واعية بالمخاطر وتدعم اتخاذ القرارات السليمة.

3.2 تعريف خطر المشروع (Project Risk)

ما هو خطر المشروع؟

خطر المشروع: هو حدث أو حالة غير مؤكدة، في حال حدوثها، يكون لها أثر إيجابي (فرصة) أو سلبي (تهديد) على هدف واحد أو أكثر من أهداف المشروع.

✓ **عدم اليقين (Uncertainty):** تمثله احتمالية الحدث (Likelihood).

✓ **الأثر (Effect/Impact):** يمثل النتيجة أو التبعة (Consequence) على الأهداف.

المعادلة الركائزية للمخاطر

$$\text{الخطر (Risk)} = \text{الأثر (Impact)} \times \text{الاحتمالية (Probability)}$$

طبيعة الأثر على المشروع

↓ (تهديد) أثر سلبي (فرصة) أثر إيجابي ↑

3.3 المخاطر الفردية مقابل المخاطر الإجمالية

المخاطر الفردية (Individual Risk)

حدث أو حالة غير مؤكدة، تؤثر في حال حدوثها بشكل مباشر على هدف أو أكثر من هدف من أهداف المشروع ككل (مثل التكلفة، الجدول الزمني، أو النطاق).

المخاطر الإجمالية (Overall Project Risk)

أثر عدم اليقين على المشروع ككل، والناجم عن كافة مصادر عدم اليقين بما فيها المخاطر الفردية. وهي تمثل تعرض أصحاب المصلحة لنتائج التباين في مخرجات المشروع.



ارتباط المخاطر بأهداف المشروع ومكوناته



المخاطر الكلية والهدف العام

المخاطر الإجمالية ليست مجرد المجموع الحسابي للمخاطر الفردية، بل تشمل التفاعلات بينها والتعرض العام لتقلبات بيئة المشروع المحيطة.



المخاطر الفردية وحزم العمل

تنشأ المخاطر الفردية من الأنشطة المحددة وحزم العمل (WBS) في أسفل الهيكل التفكيكي للمشروع، وتؤثر مباشرة على مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الأنشطة.

تنبيه هام: الحفاظ على نجاح المشروع يستلزم إدارة المخاطر الفردية على المستوى التشغيلي، وتقييم الخطر الإجمالي على المستوى الاستراتيجي لأصحاب المصلحة.




ملخص وتوزيع مخاطر المشروع (أمثلة تطبيقية)

الإجمالي (Total)	منخفضة (Low)	متوسطة (Medium)	عالية (High)	مجال الهدف (Objective Area)
20	5	10	5	النطاق والجودة (Scope & Quality)
20	5	12	3	الجدول الزمني (Schedule)
20	3	11	6	التكلفة والميزانية (Cost)
60	13	33	14	إجمالي المخاطر المرصودة

*يوضح جدول السجل جميع المخاطر وترتيب أولويات التعامل معها بحسب درجة التأثير على الأهداف الأساسية للمشروع.

3.4 توجهات أصحاب المصلحة نحو المخاطر (Risk Attitudes)

تجنب الخلل: التنبؤ "الأفضل" مقابل المكافئ المؤكد (CE)

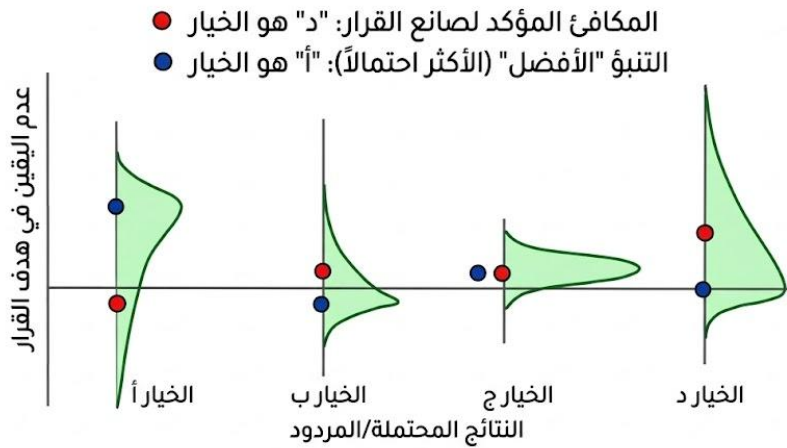

تذكر: يتم تطبيق المكافئ المؤكد (CE) على عدم اليقين في هدف القرار (وليس على مدخلات عدم اليقين)

Lumina Jun26

"Risk" Attitudes

© Steve Bag

الموقف من الخطر: (Risk Attitude) هو الاستعداد الذهني المختار تجاه عدم اليقين، والذي يتبناه الأفراد أو المجموعات بشكل صريح أو ضمني.

الباحث عن المخاطرة: (Risk Seeker) يرغب في تحمل مستويات عالية من المخاطر لتحقيق عوائد مكافأة مرتفعة.

المتحفظ /الرافض للمخاطر: (Risk Averse) يفضل تجنب عدم اليقين ويركز على حماية الأهداف القائمة.

المحايد تجاه المخاطر: (Risk Neutral) يوازن باستمرار بين المنافع والمخاطر دون تحيز.

المتحمل /المتساهل: (Risk Tolerant) يتجاهل المخاطر ولا يوليها اهتماماً حتى تتحول إلى مشكلات حقيقية.

3.5 إدارة المخاطر كعملية تكرارية (Iterative Process)



التعديل والتطوير التدريجي

تكرار عمليات إدارة المخاطر وتعديل الخُطط بانتظام يضمن الاستجابة السريعة للتغيرات الجوهرية في بيئة المشروع.



المراجعة المخططة

تحدث مخاطر جديدة، وتختفي مخاطر أخرى، أو تتغير خصائص المخاطر المحددة سابقاً، مما يتطلب إعادة التقييم بشكل دوري.



تغير الظروف المستمر

تتغير ظروف المشروع أثناء التخطيط والتنفيذ، وتتزايد المعلومات المتاحة بمرور الوقت، مما يتطلب تحديث الرؤية باستمرار.

3.6 أهمية التواصل في إدارة المخاطر (Communication)

-  **لا تعمل إدارة المخاطر بمعزل:** نجاح إدارة المخاطر يعتمد كلياً على التواصل الفعال والمستمر عبر جميع مراحل المشروع.
-  **المدخلات الشاملة من أصحاب المصلحة:** يعتمد تحديد المخاطر وتحليلها على الحصول على مدخلات شاملة ودقيقة لضمان عدم إغفال أي خطر جوهري.
-  **التواصل الموجه والمخصص:** يجب أن تصمم مخرجات وتقارير المخاطر لتلبي احتياجات كل ذي مصلحة بناءً على دوره ومسؤوليته المعتمدة.
-  **الدمج في استراتيجية الاتصال:** يجب تضمين أدوار إدارة المخاطر ضمن الخطة العامة للاتصالات المشروع.

3.7 المسؤولية المشتركة عن إدارة مخاطر المشروع



-  **ليست حكراً على الخبراء:** القول بأن "إدارة المخاطر مسؤولية الجميع" ليس مجرد شعار، بل يجب ألا تترك الإدارة لعدد قليل من المختصين فقط.
-  **جزء مدمج من العمليات:** يجب أن تكون إدارة مخاطر المشروع جزءاً لا يتجزأ من جميع عمليات إدارة المشروع الأخرى.
-  **تحديد الأدوار والمحاسبة:** يجب تحديد المسؤوليات بوضوح ومساءلة الأفراد عن تنفيذ الاستجابات المتفق عليها وتوثيق الدروس المستفادة.

3.8 دور مدير المشروع في إدارة المخاطر (Project Manager's Role)



الإدارة اليومية للمخاطر

مدير المشروع خاضع للمساءلة المباشرة عن الإدارة اليومية للمشروع، بما في ذلك التوجيه والتطبيق الفعال لعمليات إدارة المخاطر.



المسؤولية الشاملة للمشروع

يتحمل مدير المشروع المسؤولية الشاملة والرئيسية عن تسليم مشروع ناجح يحقق الأهداف المحددة بكفاءة وفاعلية.

المسؤوليات الـ 11 الرئيسية لمدير المشروع في المخاطر

- ✓ تشجيع دعم الإدارة العليا: لكافة أنشطة إدارة المخاطر.
- ✓ إعداد واعتماد الخطة: تطوير خطة إدارة المخاطر للمشروع.
- ✓ تحديد المستويات المقبولة: بالتشاور مع أصحاب المصلحة.
- ✓ تسهيل التواصل المفتوح: الشفافية والصراحة حول المخاطر.
- ✓ المشاركة الكاملة: في كافة جوانب وعمليات المخاطر.
- ✓ اعتماد الاستجابات: والموافقة على خطط العمل قبل التنفيذ.
- ✓ استخدام احتياطي الطوارئ: لمواجهة المخاطر عند حدوثها.
- ✓ رفع التقارير المنتظمة: عن حالة المخاطر وإحالة التوصيات للقيادة.
- ✓ تصعيد المخاطر: الخارجة عن الصلاحية للإدارة العليا.
- ✓ مراقبة الكفاءة والفاعلية: لعمليات إدارة المخاطر.
- ✓ التدقيق وتوثيق الدروس: تقييم الأثر وتسجيل الخبرات.

ما هو تعريف "خطر المشروع" وفقًا للمفاهيم الأساسية؟

- (أ) حدث مؤكد يحدث في نهاية المشروع يؤثر سلبًا فقط على الميزانية.
- (ب) حدث أو حالة غير مؤكدة، في حال حدوثها، يكون لها أثر إيجابي (فرصة) أو سلبي (تهديد) على أهداف المشروع.
- (ج) مشكلة حقيقية وقعت بالفعل وتتطلب استجابة فورية من مدير المشروع.
- (د) المجموع الحسابي المباشر لجميع الأنشطة التشغيلية للمشروع.

كيف تُحسب قيم الخطر بناءً على "المعادلة الركائزية للمخاطر"؟

أ) الخطر = التكلفة ÷ الجدول الزمني

ب) الخطر = النطاق + الجودة

ج) الخطر = الاحتمالية × الأثر

د) الخطر = عدد المخاطر الفردية ÷ التهديدات الإجمالية

ما هو الوصف الصحيح للشخص الذي يُصنّف سلوكه بـ "الباحث عن المخاطرة" (Risk Seeker)؟

- أ) يفضل تجنب عدم اليقين ويركز على حماية الأهداف القائمة.
- ب) يتجاهل المخاطر ولا يوليها اهتماماً حتى تتحول إلى مشكلات.
- ج) يوازن باستمرار بين المنافع والمخاطر دون تحيز.
- د) يرغب في تحمل مستويات عالية من المخاطر لتحقيق عوائد مكافأة مرتفعة.

ما الفرق الرئيسي بين المخاطر الفردية والمخاطر الإجمالية للمشروع؟

- أ) المخاطر الفردية تنشأ من أهداف استراتيجية، بينما المخاطر الإجمالية تؤثر فقط على الجودة.
- ب) المخاطر الفردية تؤثر مباشرة على أنشطة/حزم العمل (WBS) بينما المخاطر الإجمالية تمثل أثر عدم اليقين على المشروع ككل.
- ج) المخاطر الإجمالية هي المجموع الحسابي البسيط للمخاطر الفردية دون تفاعلات بينها.
- د) المخاطر الفردية تخص الإدارة العليا فقط، بينما المخاطر الإجمالية تخص فريق العمل الميداني.


لماذا تُعتبر إدارة المخاطر "عملية تكرارية" (Iterative Process) خلال دورة حياة المشروع؟

- أ) لأن الظروف تتغير، وتستجد معلومات جديدة، وتظهر مخاطر أو تختفي بمرور الوقت مما يتطلب تحديثاً ومراجعة دورية.
- ب) لأنها تُنفَّذ مرة واحدة فقط أثناء مرحلة تخطيط المشروع ولا تتغير بعد ذلك.
- ج) لأن مدير المشروع هو الشخص الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرارات اليومية.
- د) بهدف اقتصار مسؤولية إدارة المخاطر على فريق الخبراء فقط.

الإجابات الصحيحة للأنشطة:

النشاط	الإجابة الصحيحة
1	ب
2	ج
3	د
4	ب
5	أ

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

